

PROPUESTA DE DESARROLLO

Sistema Integral de Gestión de Diplomados

Etapas 2 — Expansión y Consolidación del Sistema

Decanato de Ciencias de la Salud — UCLA

Mayo 2026

1. Contexto del Proyecto

El Decanato de Ciencias de la Salud de la UCLA cuenta con un sistema de gestión de diplomados desarrollado en la Etapa 1, el cual cubre los procesos de inscripción, gestión de pagos, constancias digitales con validación QR, control académico y reportes gerenciales.

Ese sistema fue concebido inicialmente para gestionar una cohorte a la vez. La realidad operativa del programa ha demostrado que simultáneamente pueden estar activas tres cohortes en distintas fases: una en proceso de cierre, otra en plena ejecución académica y una tercera en período de inscripciones.

Esta segunda etapa responde directamente a ese crecimiento. No se trata de construir desde cero, sino de expandir, consolidar y profesionalizar la plataforma existente para que soporte la operación real del programa con todos sus actores, procesos y necesidades.

2. Alcance de la Etapa 2

Esta etapa incorpora 10 módulos nuevos al sistema existente, organizados en dos fases de desarrollo de 4 semanas cada una. El tiempo estimado de entrega es de 8 semanas, considerando la experiencia acumulada en el sistema existente y la metodología de desarrollo aplicada.

Fase 1 — Semanas 1 a 4

- Centro de control de cohortes — módulo base que unifica toda la gestión multi-cohorte
- Portal de profesores — acceso propio con carga de notas, asistencia y horarios
- Gestión de horarios — horario teórico tradicional y horario de prácticas mensual

Fase 2 — Semanas 5 a 8

- Personal — catálogo de todo el personal vinculado al diplomado
- Nómina — gestión de nóminas con generación automática de órdenes de pago
- Contratos — ciclo de vida completo de contratos con QR y seguimiento
- Gestión de egresos — órdenes de pago, registro con comprobante y conciliación
- Dashboard financiero — vista ejecutiva de caja en tiempo real
- Sistema de correspondencia — motor de plantillas dinámicas para cualquier documento

Módulos existentes que se extienden

- Control académico — carga de notas por parte, bloqueo al cierre y generación automática de documentos de egreso
- Expedientes — integración formal al proceso de cierre con validación QR
- Financiero — conexión con dashboard y módulo de egresos

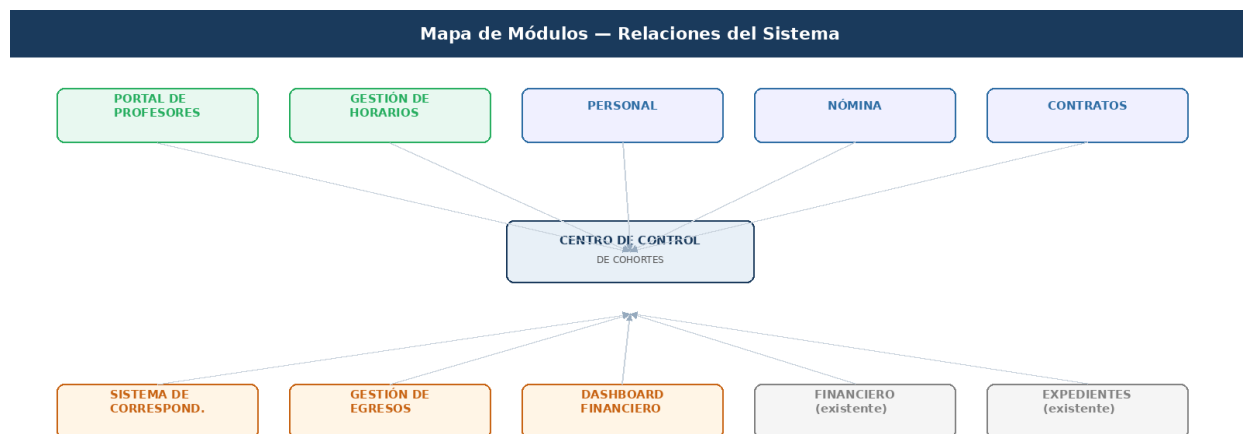


Figura 1. Mapa de módulos y relaciones del sistema

3. Descripción de Módulos

3.1 Centro de control de cohortes

Módulo base de toda la etapa. Unifica las bases de datos fragmentadas en una sola estructura centralizada donde cada registro está asociado a una cohorte mediante un identificador único. El administrador selecciona la cohorte activa al entrar al sistema y toda la información se filtra automáticamente sin que el usuario final lo note. Resuelve el problema estructural de tener múltiples instancias corriendo en paralelo y sienta la base técnica para el crecimiento futuro.

3.2 Portal de profesores

Acceso propio para profesores con usuario y contraseña. Pueden ver sus clases asignadas, cargar la nota final de su parte (teórica, práctica o virtual), consultar la matrícula de su materia, registrar asistencia y ver el historial de clases. Los roles están diferenciados — profesor teórico y docente de práctica — y cada uno solo ve lo que le corresponde. Las notas se bloquean automáticamente al cierre del proceso académico.

3.3 Gestión de horarios

Gestiona dos tipos: horario teórico semanal (lunes a domingo, hora inicio, fin y materia) y horario de prácticas mensual por diplomado y grupo, con selección de bloques de días en conjunto. Genera el horario imprimible y mantiene el calendario de clases por profesor, alimentando el control de asistencia y las órdenes de pago automáticas.

3.4 Personal

Catálogo de todo el personal vinculado al diplomado. No son usuarios del sistema sino registros operativos con tipo, datos de pago y monto por sesión. Tipos: profesor teórico, docente de práctica, coordinador de práctica, coordinador de entornos virtuales, administrativo, mantenimiento, vigilancia y audiovisual. El sistema verifica que exista plantilla de contrato configurada antes de crear personal.

3.5 Nómina

Gestiona nóminas según la frecuencia de pago de cada tipo: por sesión para profesores, mantenimiento, vigilancia y audiovisual; por suma acumulada de prácticas para docentes; quincenal fijo para administrativos; fecha no fija para coordinadores. Al cargar asistencia se genera automáticamente la orden de pago.

3.6 Contratos

Ciclo de vida completo de contratos por tipo de personal. Plantillas editables desde el sistema de correspondencia. Al generar un contrato se produce el PDF, se almacena en base de datos, se asigna QR de validación y se registra su estado: activo, vencido o renovado. Modificaciones posteriores generan comprobante trazable.

3.7 Gestión de egresos

Control de todos los pagos del programa. Órdenes automáticas desde nómina al cargar asistencia, o manuales para gastos y proveedores. Cada orden incluye beneficiario, concepto, tasa BCV, monto en bolívares y datos de pago. El comprobante es obligatorio al registrar el pago. Incluye reporte de conciliación de egresos.

3.8 Dashboard financiero del diplomado

Vista ejecutiva del estado de caja de cada diplomado. Muestra en tiempo real el total ingresado, total egresado y saldo disponible. Permite registrar movimientos rápidos con soporte adjunto obligatorio. Diseñado para que el coordinador tenga visibilidad financiera completa de un vistazo.

3.9 Sistema de correspondencia y generación de documentos

Motor de plantillas para cualquier documento institucional. El administrador combina variables fijas del sistema con campos personalizados. Tipos de documento categorizados: contrato, carta, memo, oficio, constancia, acta, reconocimiento. Genera PDF, almacena en base de datos y asigna QR de validación. Modificaciones producen acta trazable.

4. Presupuesto

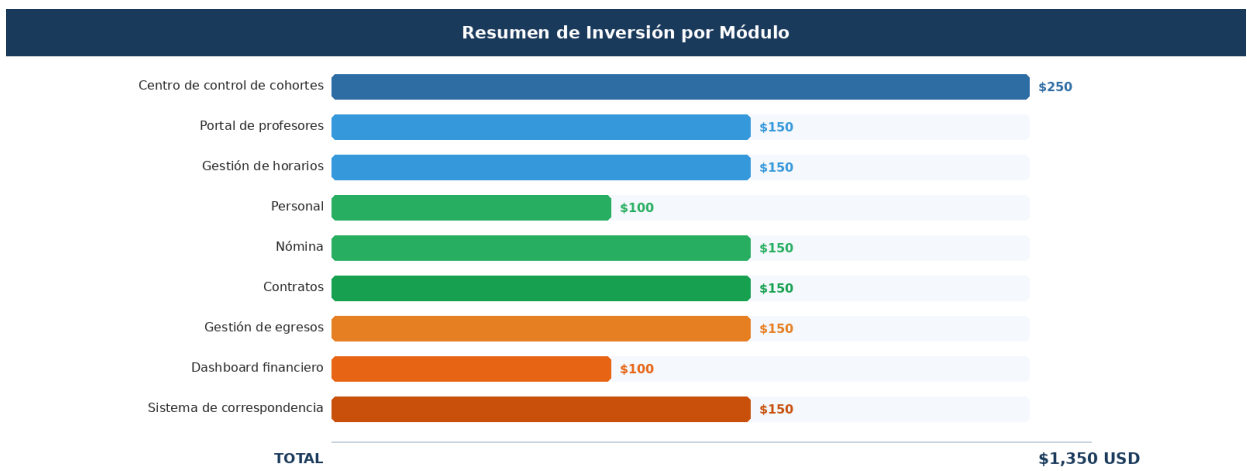


Figura 2. Inversión por módulo

Módulo	Inversión (USD)
Centro de control de cohortes	\$270
Portal de profesores	\$160
Gestión de horarios	\$160
Personal	\$110
Nómina	\$160
Contratos	\$160
Gestión de egresos	\$160
Dashboard financiero del diplomado	\$100
Sistema de correspondencia y generación de documentos	\$160
TOTAL DEL PROYECTO	\$1,440 USD

Condiciones del presupuesto

- La moneda de referencia es dólares estadounidenses (USD).
- Formas de pago: Zelle, USDT (Binance), efectivo en USD.
- Funcionalidades adicionales fuera del alcance se cotizan de forma independiente.
- Cambios sustanciales durante el desarrollo pueden implicar ajustes en el cronograma.
- El cliente se compromete a entregar formatos, validaciones y recursos oportunamente.

5. Plan de Pagos

Pago	Descripción	Monto
1	Al firmar el acuerdo — inicio del proyecto	\$480 USD
2	Al cumplirse 4 semanas desde el inicio	\$480 USD
3	Al cumplirse 8 semanas — cierre del proyecto	\$480 USD

Los pagos están atados al calendario del proyecto, no a entregables específicos. El proyecto inicia una vez recibido el primer pago. Los pagos realizados no son reembolsables.

6. Garantía y Acompañamiento

Garantía incluida — 2 meses sin costo

Una vez entregado el proyecto se incluyen dos meses de garantía sin costo adicional. Durante este período se atienden correcciones de errores y fallas relacionadas directamente con el sistema desarrollado en esta etapa.

Acompañamiento posterior

Finalizado el período de garantía, se evalúa conjuntamente si el programa requiere acompañamiento continuo. En ese momento se define el alcance y condiciones según las necesidades reales. No se impone ningún contrato de mantenimiento previo — la relación se construye sobre la base de la confianza y los resultados demostrados.

7. Cronograma de Desarrollo



Figura 3. Línea de tiempo del proyecto

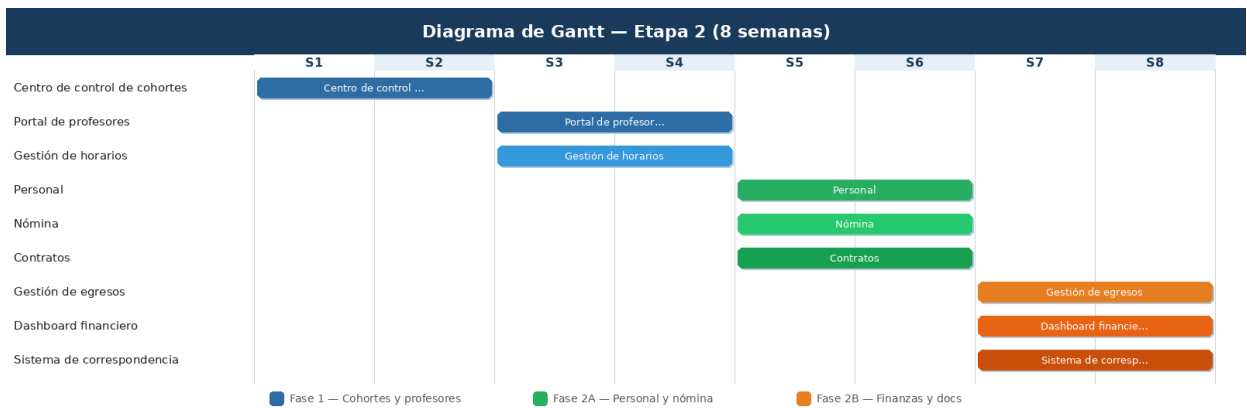


Figura 4. Diagrama de Gantt — distribución de módulos por semana

Período	Actividad
Semanas 1–2	Centro de control de cohortes — reestructuración de base de datos y lógica multi-cohorte
Semanas 3–4	Portal de profesores + Gestión de horarios (teórico y práctico)
Semanas 5–6	Personal + Nómina + Contratos
Semanas 7–8	Gestión de egresos + Dashboard financiero + Sistema de correspondencia
Meses 3–4	Garantía — atención de correcciones y soporte sin costo adicional

Nota: El cronograma puede adelantarse según la disponibilidad de información, formatos y validaciones por parte del cliente. A mayor colaboración y respuesta oportuna, menor tiempo de entrega.

Esta propuesta tiene una vigencia de 30 días a partir de su fecha de emisión.
